



POZDĹŽNY REZ - PÔVODNÝ STAV
M 1:100

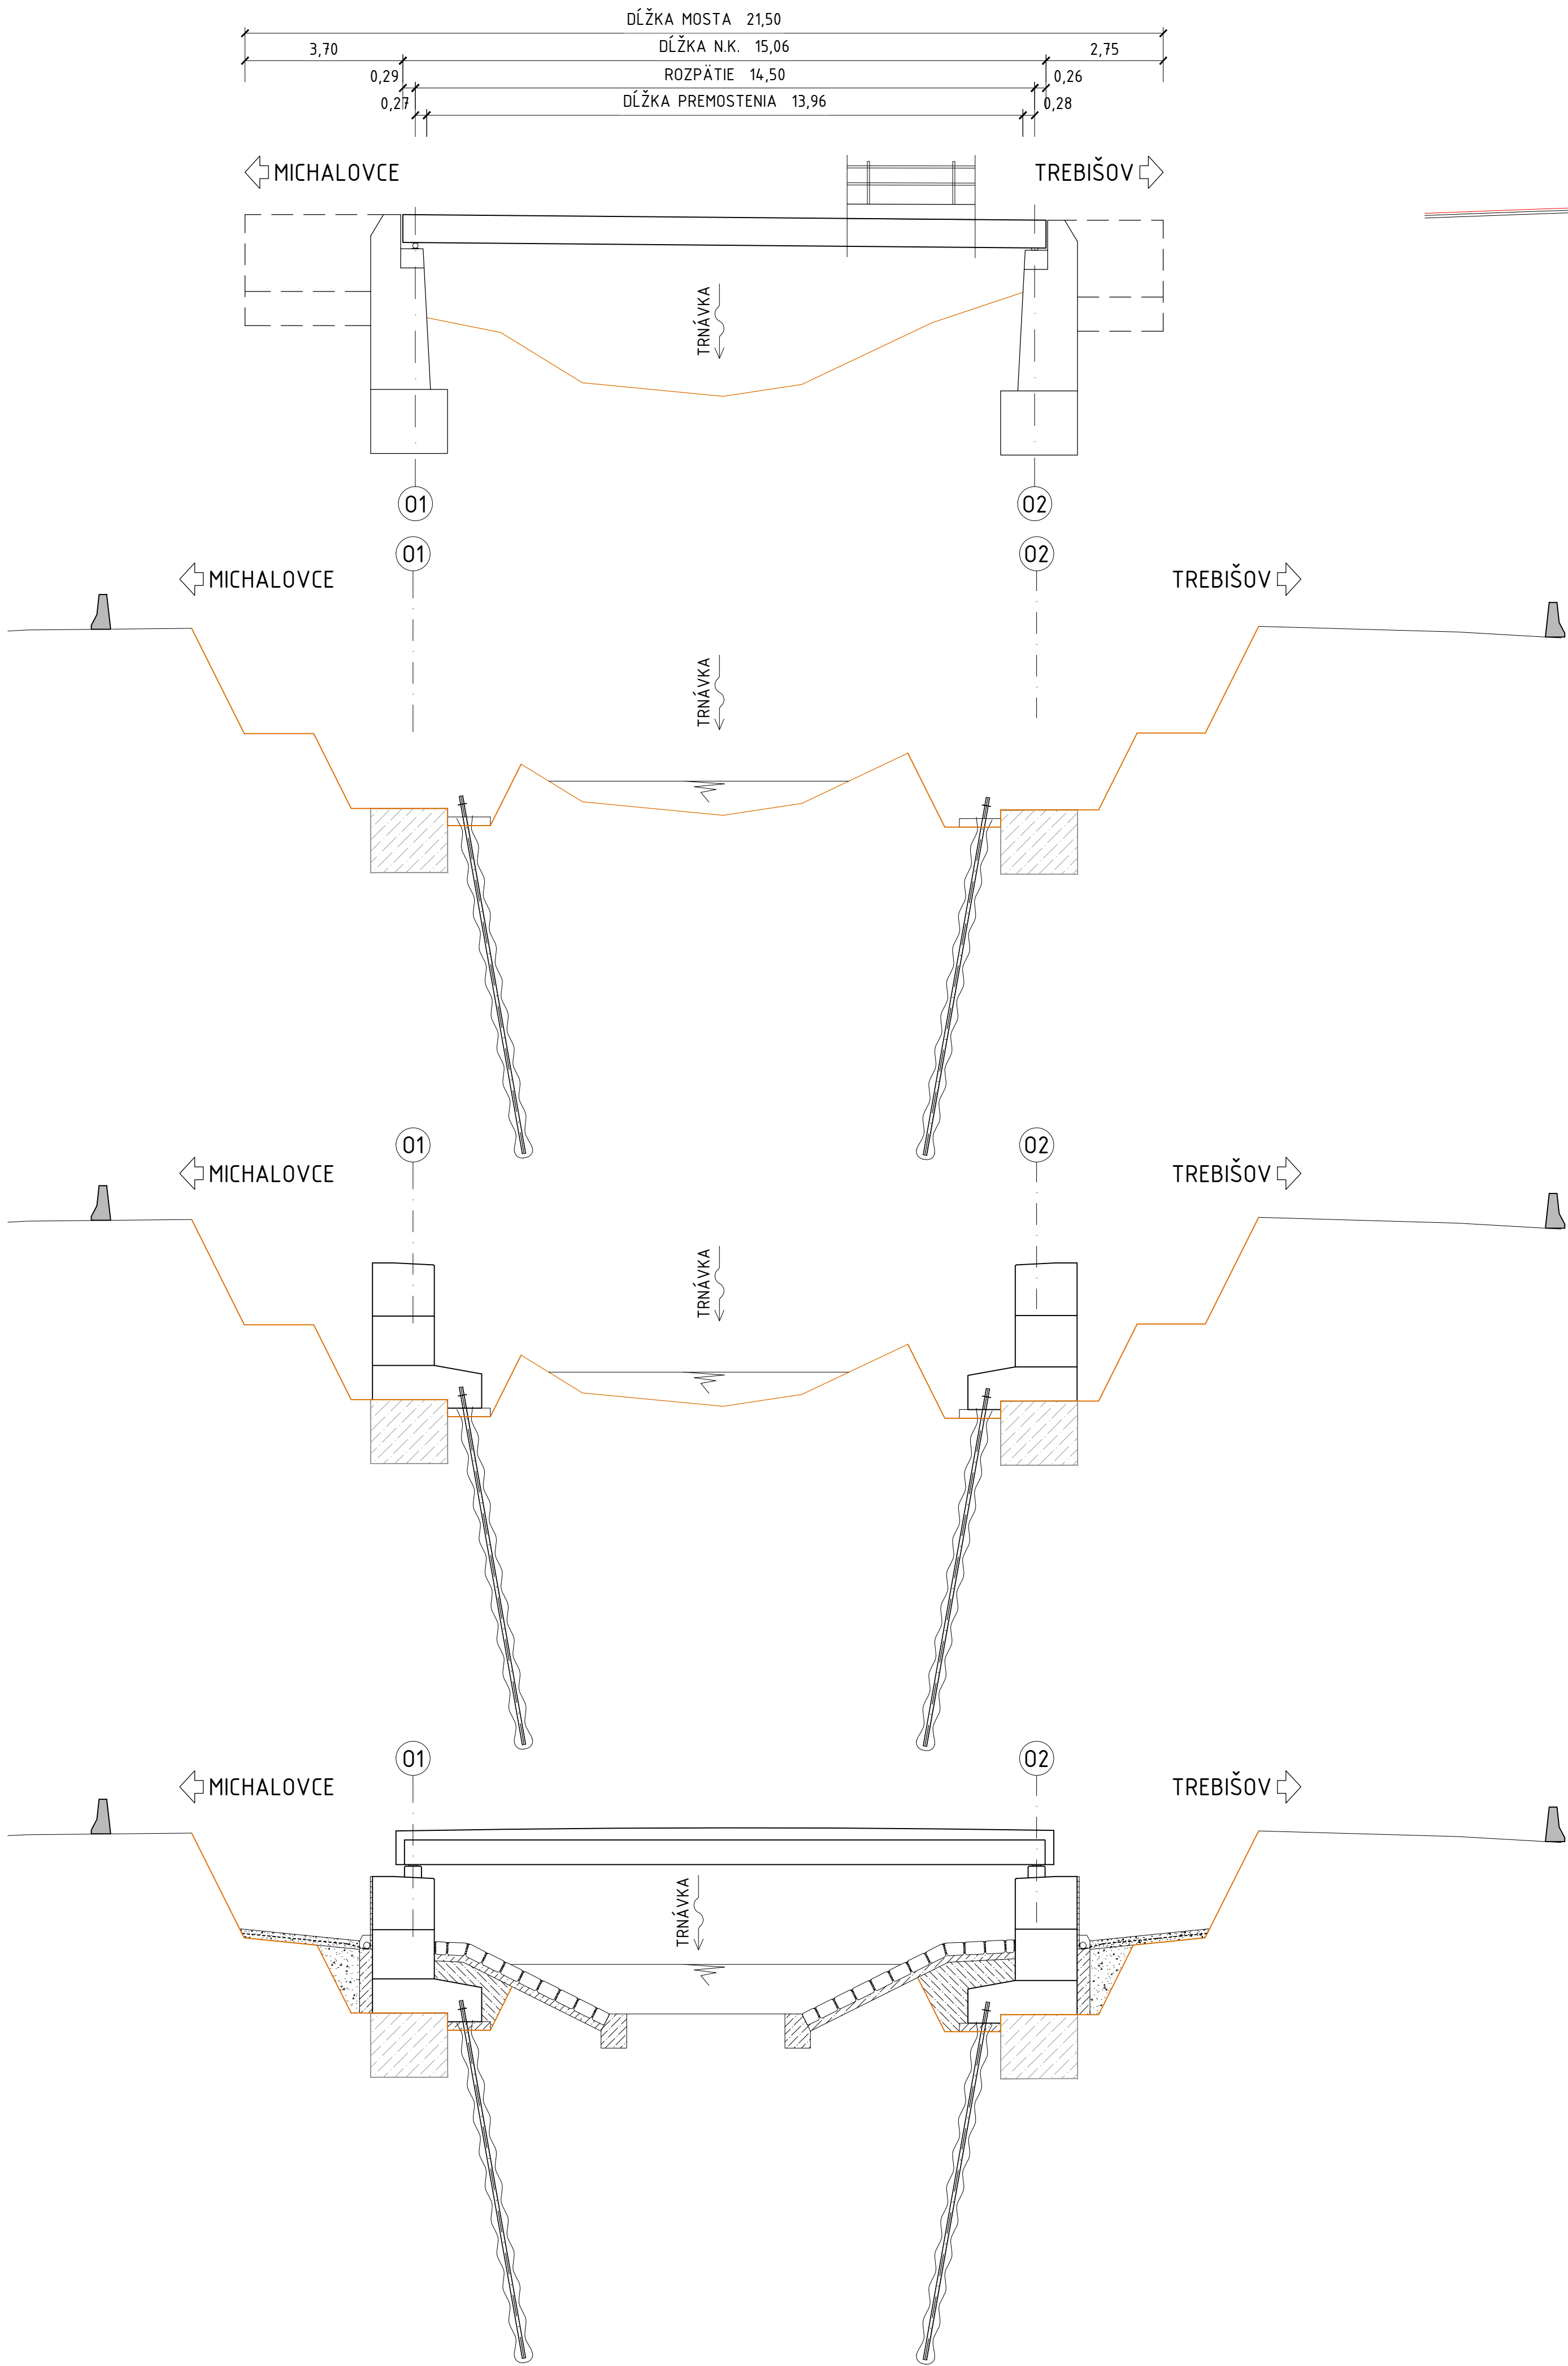

POZDĹŽNY REZ - NAVRHOVANÝ STAV
M 1:100

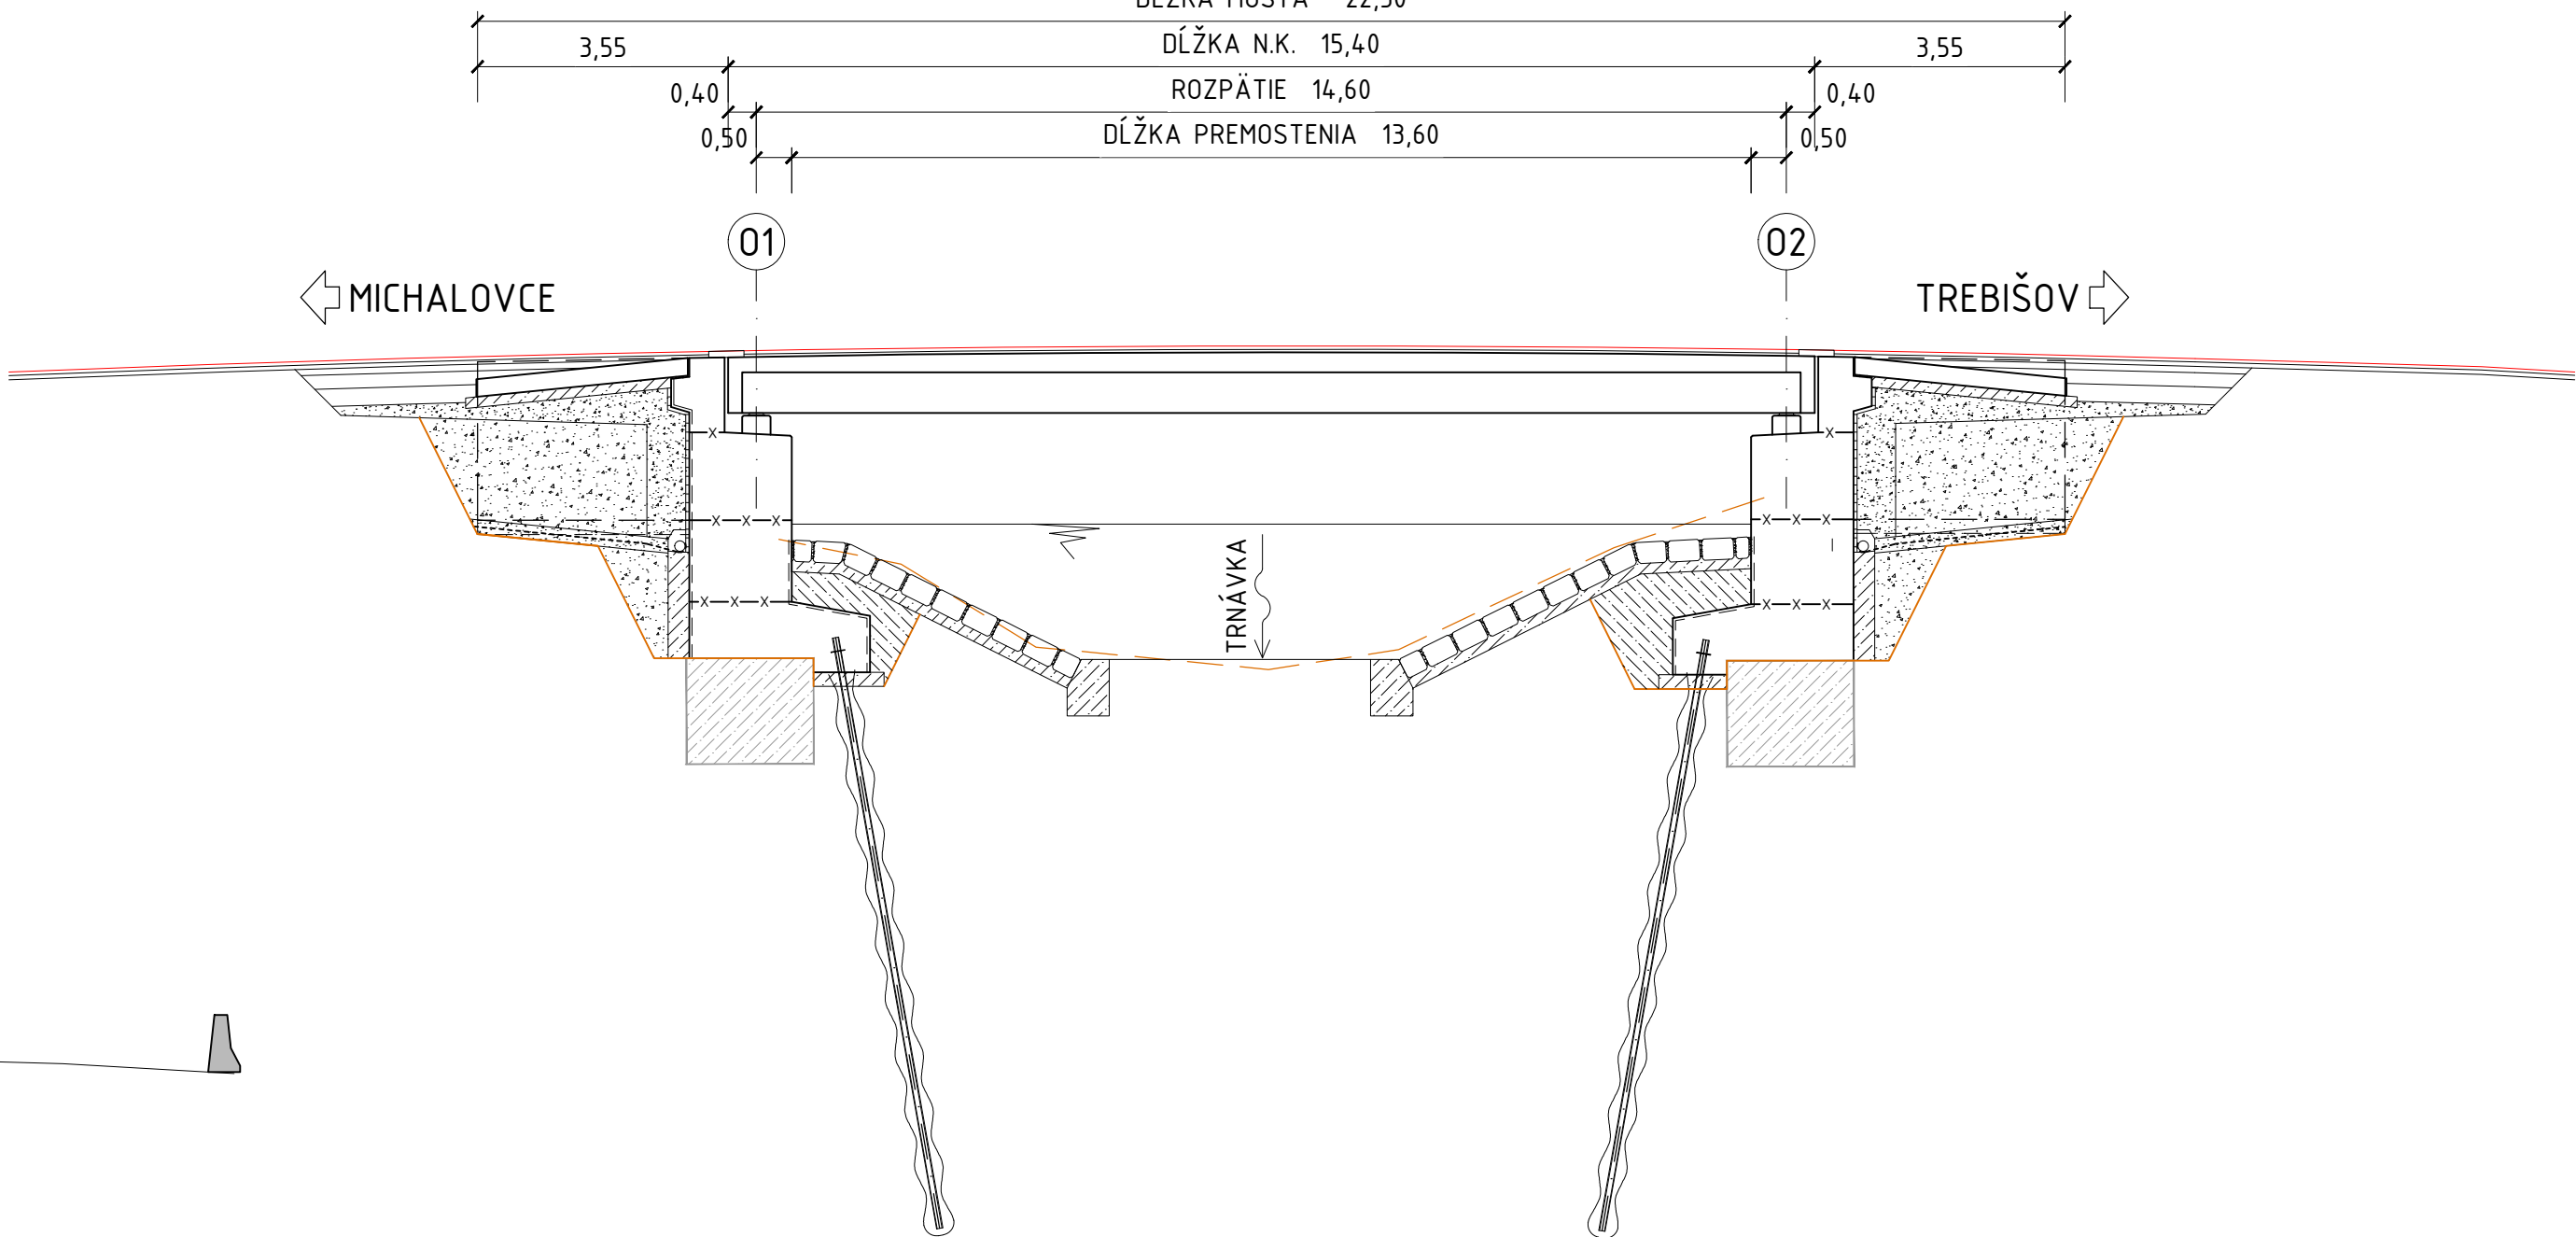

ODPORUČANÝ POSTUP VÝSTAVBY:

- OSADENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, ÚPLNÁ UZÁVERA CESTY III/3736 A MOSTA M1843,
- VYTÝČENIE OBVODU STAVENISKA A STAVEBNÉHO OBJEKTU,
- VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ, PREKLÁDKA/OCHRANA KOLIDUJÚCICH IS,
- PRELOŽENIE OCELOVEJ LÁVKY PRE PEŠÍCH,
- DOČASNÁ PREKLÁDKA EXISTUJÚCEHO PODZEMNÉHO VEDENIA SLOVAK TELEKOM OBJEKT 601-00,
- DEMOLÁCIA EXISTUJÚCEHO MOSTA M1843,
- ZEMNÉ PRÁCE, ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE, REALIZÁCIA ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK MIKROPILÓT,
- REALIZÁCIA ZAKLADANIA A ČASTI SPODNEJ STAVBY (ZÁKLADY, DRIEKY, ÚLOŽNÉ PRAHY),
- IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY, REALIZÁCIA SPÄTNÝCH, HUTNENÝCH, ZÁSYPOV SPODNEJ STAVBY A ČASTI PRECHODOVEJ OBLASTI,
- UKLADANIE MOSTNÝCH PREFABRIKÁTOV, REALIZÁCIA SPRIAHOVACEJ DOSKY A PRIEČNIKOV - ZMONOLITNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE,
- DOKONČENIE KRÍDEL, REALIZÁCIA ZÁVERNÝCH MÚRIKOV,
- REALIZÁCIA PRECHODOVÝCH OBLASTÍ A PRECHODOVÝCH DOSIEK,
- VÝBUDOVANIE RÍMS, SPEVNENIA KRAJNICE ZA OPORAMI A BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ,
- IZOLÁCIA MOSTOVKY A ZRIADENIE KONŠTRUKCIE VOZOVKY,
- OSADENIE MOSTNÝCH ZÁVEROV A ZÁLIEVOK NA MOSTE,
- REALIZÁCIA ÚPRAVY POTOKA,
- DOKONČOVACIE PRÁCE,
- ODSTRÁNENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA,
- UVEDENIE MOSTA DO PREVÁDZKY,
- PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY JE 18 MESIACOV.

D.3

VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV PALGUT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROSLAV PALGUT	KONTROLOVAL: ING. MARTIN RUŠÍN	 MOSTAT, spol. s r.o. Bielehradská 18, 040 19 Košice	
OBJEDNÁVATEL: SPRÁVA CIEST KSK	OKRES STAVBY: KATASTRÁLNE ÚZEMIE: TREBIŠOV; VOJČICE	STAVBA:	STUPEŇ: DSPRS	FORMÁT: 8xA4
REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843 CEZ POTOK TERNÁVKA V OBCI VOJČICE			DÁTUM: 05.2024	Č. ZÁKAZKY: 3039-22
OBJEKT: 201 REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843			MIERKA: 1:100	Č. ARCH: 216
NÁZOV PRÍLOHY: POSTUP VÝSTAVBY			ČÍSLO PRÍLOHY: 3.2.3	ČÍSLO ÚPRAVY:
